


N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources	Tri 1, 2018				Tri 2, 2018		Tri 3, 2018			Tri 4, 2018		
						Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov
1	Débit réservé Verdon à 3 m³/s	211 jours	Lun 01/01/18	Ven 28/12/18													
2	Débit réservé Verdon à 1,5 m/s	56 jours	Dim 01/07/18	Sam 15/09/18													
3	Période possible pour la réalisation des travaux vis-à-vis des enjeux environnementaux	87 jours	Ven 01/06/18	Dim 30/09/18													
4																	
5	COPIL	0 jour	Mer 24/01/18	Mer 24/01/18	COPIL												
6	Remise rapport AVP définitif	0 jour	Mar 30/01/18	Mar 30/01/18	SCP												
7	Consultation MOE (procédure adaptée)	15 jours	Mer 31/01/18	Mar 20/02/18	Mairie de Castellane												
8	Réalisation du PRO et des études réglementaires	15 jours	Mer 21/02/18	Mar 13/03/18	MOE												
9	COPIL	0 jour	Mar 20/03/18	Mar 20/03/18	COPIL												
10	Dépôt des dossiers réglementaires	0 jour	Mar 27/03/18	Mar 27/03/18	Mairie de Castellane												
11	Instruction des dossiers réglementaires	50 jours	Mer 28/03/18	Mar 05/06/18	Autorité environnementale												
12	Obtention des autorisations réglementaires	0 jour	Mar 05/06/18	Mar 05/06/18	Autorité environnementale												
13	Réalisation du DCE du marché de travaux	10 jours	Mer 11/04/18	Mar 24/04/18	MOE												
14	Finalisation du DCE du marché de travaux	5 jours	Mer 06/06/18	Mar 12/06/18	MOE												
15	Consultation pour les travaux (procédure adaptée)	30 jours	Mer 13/06/18	Lun 23/07/18	Mairie de Castellane												
16	Choix de l'entreprise, période de préparation, réalisation des travaux	50 jours	Mar 24/07/18	Lun 01/10/18	Entreprise												



Projet : Planning Seuil Listes
Date : Mer 17/01/18

Tâche

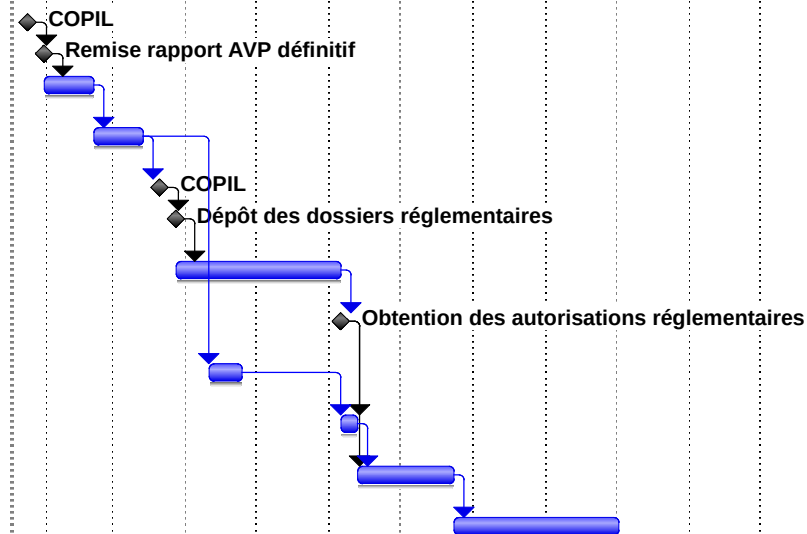

Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement



Récapitulatif du projet



Échéance

